

**TRANVÍA****CUENCA**

S.A. MUNICIPAL

INFORMACIÓN CONTRATO DE EMERGENCIA No. 13**Fecha:** 01 de junio de 2017**Objeto del Contrato:**

CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA TERMINACION DEL MURO DE PILOTES Y VIGA DE ATADO EN EL SEC

Nombre Contratista:

INGENIERIA DE LA TIERRA S.A. INTISA

Plazo:

30 DIAS

Monto:

67.581,77 USD

Ampliaciones de plazo:

NINGUNA

Estado actual:

CONTRATO TERMINADO

Avance:

100% DE AVANCE


Resultados obtenidos:

Uno de los beneficios de terminar estos tres pilotes y la viga de atado, es ya terminar por completo el muro de contencion del talud del aeropuerto.

El desalojo del material que sirvio de badem para ubicar la maquinaria y poder trabajar en el pilotaje, esto nos sirve para liberar el espacio en la via sur de la bajada de milchichig.

Una vez liberado y desalojado todo el material se podra intervenir de manera inmediata en el revestimiento del muro de pilotes y se ganarian 30 dias en el nuevo contrato de ejecucion de obra civil.

FOTOGRAFÍAS

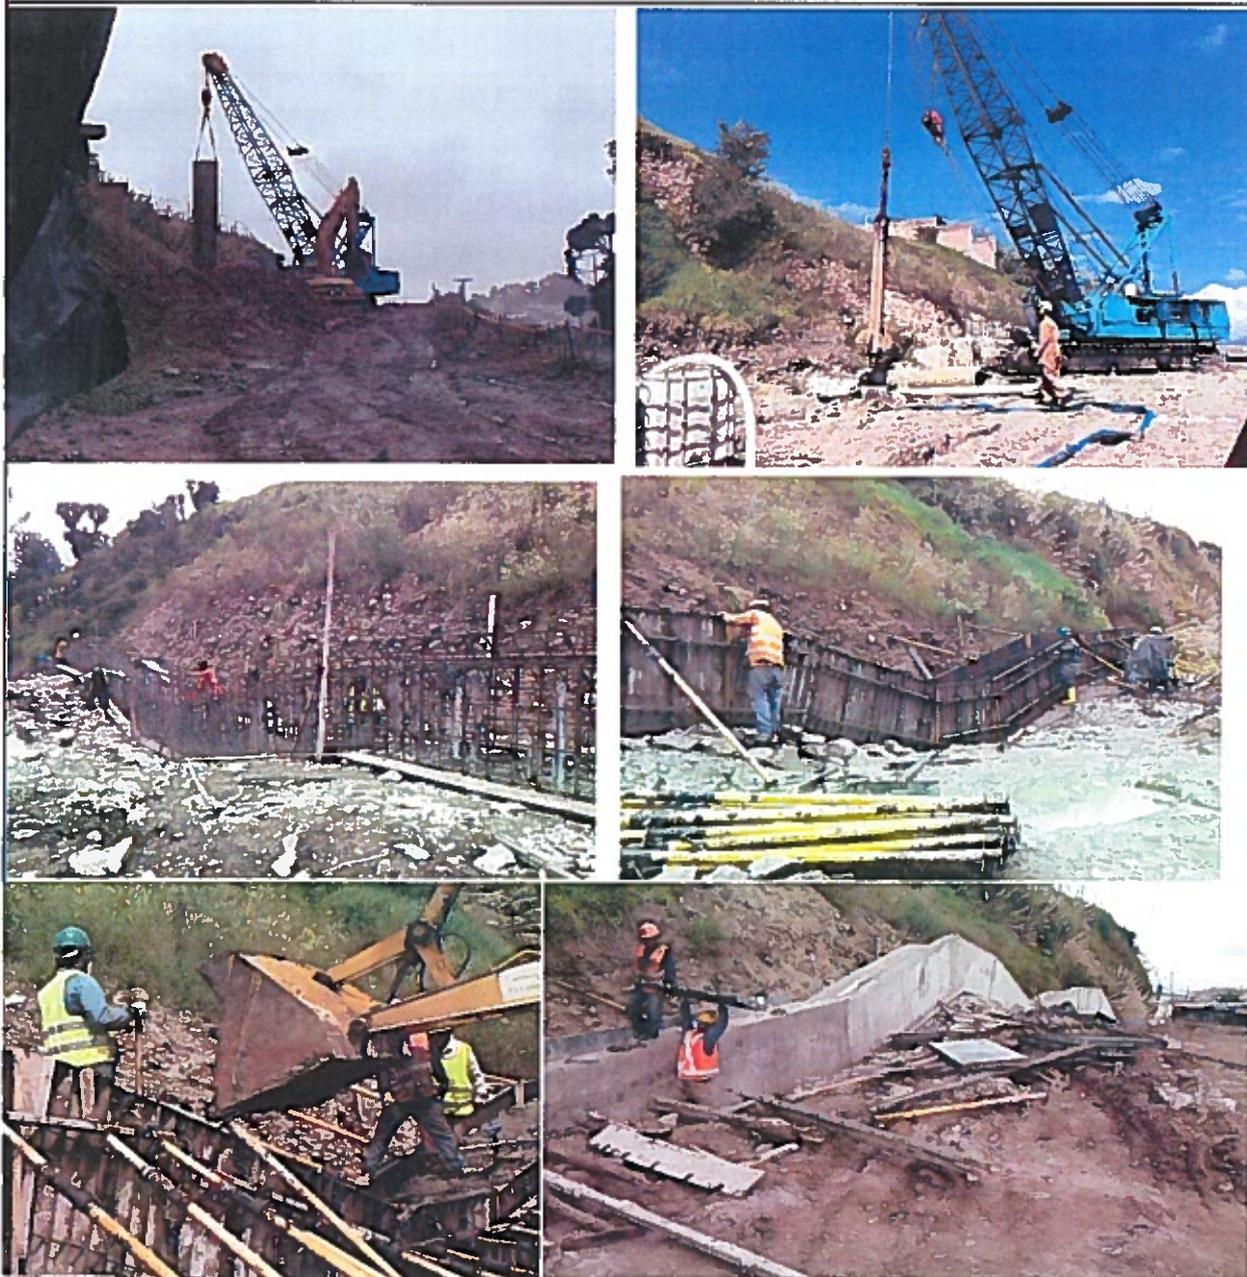

Observaciones:

El contrato no tiene observaciones se cumplió dentro del plazo estipulado y a satisfacción inclusive ya tiene acta de entrega de Recepción Provisional

Se realizaron las pruebas de calidad de todos los materiales e inclusive se hicieron visitas a las fábricas

Firma de responsabilidad:

Ing. Trotsky Fernando Narvaez Montoya
Administrador de Contrato de Emergencia No. 13
