



TRANVIA

CUENCA
E.S. MUNICIPAL

INFORMACIÓN CONTRATO DE EMERGENCIA No. 9

Fecha: 28 de junio de 2017

Objeto del Contrato: "Reposición de las líneas eléctricas de distribución de media y baja tensión en la Av. Sangurima, entre Mariano Cueva y Av. Huaynacapac"

Nombre Contratista: Ing. Mario Alfonso Ulloa Cabrera

Plazo: 60 días

Monto: \$76.237,42

Ampliaciones de plazo:

Estado actual: En Ejecución

Avance: 5%


Resultados obtenidos:

1.- Actualmente se esta realizando los trabajos de reubicación de redes de media y baja tensión en la intersección de la Av. Gaspar Sangurima y Manuel Vega, con finalidad de continuar con el tendido de rieles y urbanización de la zona.

Observaciones:

La ejecución de trabajos objeto del contrato han sido reactivados con fecha 26 de Junio, sin embargo se esta a la espera de obras civiles para la modificación y reubicación de redes eléctricas en la Parada prevista en Plaza Civica, la cual deben realizarse trabajos para la reubicación de las redes que se ven afectadas por la implantación de dicha parada.

FOTOGRAFÍAS

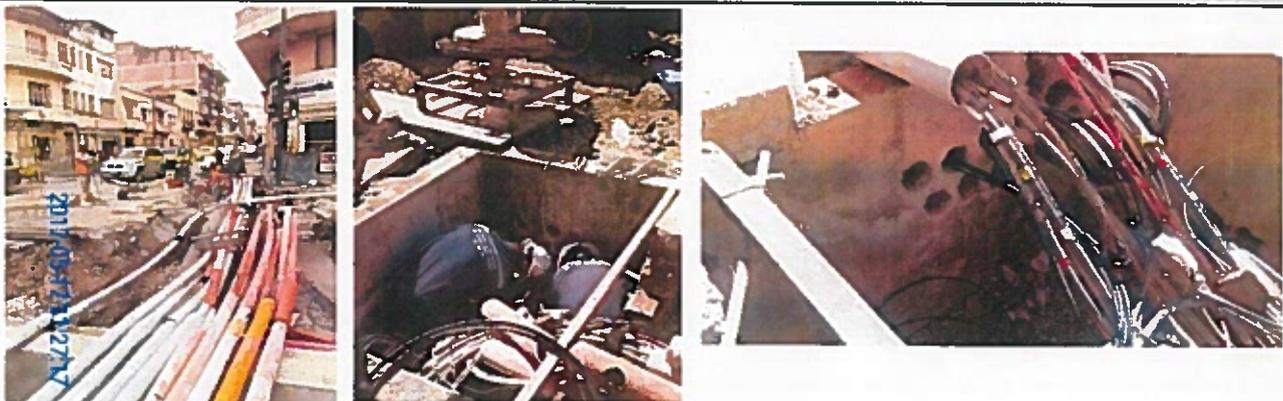

Firma de responsabilidad:

Ing. Felipe Peña R.

Administrador de Contrato de Emergencia No. 9
